

2013

JAARVERSLAG

STICHTING

Zeewolde Werelddorp

ZEEWOLDE WERELDDORP



Inhoudsopgave.



- 1 Voorwoord**
- 2 Doelstelling**
- 3 Eindrapportage project “Doorleren in Gaongho”**
- 4 Bezoek aan Gaongho**
- 5 Financieel overzicht 2014**
- 6 Plannen voor 2014**
- 7 Caritas binnen de parochie “Sterre Der Zee”**
- 8 Bestuur**

1 Voorwoord

De uitdrukking “Een druppel op een gloeiende plaat” gaan we vervangen door “Iedere (irrigatie) druppel helpt”

De uitdrukking die we nog al eens horen “Een druppel op een gloeiende plaat” met andere woorden het helpt niet, is m.i. niet terecht want ieder opgeleid kind of volwassene is een stukje vooruitgang in de ontwikkeling van Burkina Faso.

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de bouw van het schoolgebouw in Gaongho (zie hoofdstuk 3), een activiteit waar we vanuit in Zeewolde niet veel aan hoefden te doen.

Toetreding P.C.I. (parochiële Caritas Instelling) van de Rooms-katholieke Kerk “STERRE DER ZEE” in Zeewolde.

Deze instelling heeft zijn medewerking aan Zeewolde Werelddorp toegezegd. U begrijpt we zijn daar erg blij mee.

Bezoek aan Gaongho, er waren een tweetal redenen om dit bezoek af te leggen;

- 1 om aanwijzingen te geven bij de afbouw en de eindrapportage.**
- 2 onderzoek naar de mogelijkheden om regenwater op te vangen en in het droge seizoen met druppelirrigatie een tweede oogst mogelijk te maken.**

Zie hoofdstuk 4

Piet Stam

Zeewolde Werelddorp

2 Doelstelling

Het doel van stichting Zeewolde Werelddorp is tweeledig, t.w.:

1 De inwoners van Zeewolde informeren over de leefwijze In het dorpje Gaongho (Burkina Faso).

2 Het zoeken naar inkomstenbronnen om met dat geld projecten te Ondersteunen die de leefbaarheid daar verbeteren.

De door ons te ondersteunen projecten zullen betrekking hebben op onderwijs, watervoorziening en gezondheidszorg.

Door het gericht steunen van het dorp kunnen we wellicht iets meer betekenen dan de spreekwoordelijke druppel.

3 Eindrapportage project “Doorleren in Gaongho”

Eindrapportage project “Doorleren in Gaongho”, uitbreiding van de middelbare school in Gaongho, Burkina Faso

A. Inhoudelijk verslag

De aanvraag van ADDG voor dit project kwam voort uit het verzoek van de bevolking van Gaongho om de middelbare school uit te breiden. Voor veel leerlingen die uit het basisonderwijs wilden doorstromen naar het voortgezet onderwijs moest elk jaar de toegang worden geweigerd. De klassen waren overvol met soms meer dan 100 leerlingen in de klas. De kwaliteit van het onderwijs kwam hierdoor in het geding.

Het bestuur van ADDG heeft de aanvraag aan Stichting Zeewolde Werelddorp (ZWD) verstuurd waarna het bestuur de aanvraag heeft goedgekeurd en fondsen heeft gezocht, waaronder bij de Turing Foundation.



Behaalde doelen

Sinds 2010 heeft Stichting Zeewolde-Werelddorp een vriendschapsband met de gemeente Gaongho in Burkina Faso. Het dorp bestaat uit een kern met daarom heen nog 11 andere dorpen. ADDG is de belangenbehartiger van de bevolking en werkt vanuit Gaongho en de hoofdstad Ouagadougou aan armoedebestrijding en verbeteringen voor het welzijn van de bevolking. Zeewolde Werelddorp is haar Nederlandse partner en werft fondsen voor projecten die zijn aangedragen door de lokale bevolking via ADDG. Ook geeft ZWD voorlichting in Nederland op scholen, kerken en andere maatschappelijke instanties.

In het kader van de Millenniumdoelstellingen is een goede onderwijsvoorziening in het dorp een doel van Zeewolde Werelddorp en ADDG samen.

Het project is met succes uitgevoerd. Er zijn nu vier extra klaslokalen en een magazijn bijgebouwd en een administratiegebouw voor het personeel. De Burkinese overheid heeft twee jaar geleden ook twee klassen bijgebouwd. Met het reeds bestaande gebouw van vier klassen is het Collège nu officieel een Lyceum geworden met in totaal 10 klaslokalen.

De leerlingen uit Gaongho en omstreken hebben nu de mogelijkheid om tot en met het BAC diploma in de naaste omgeving naar school te gaan. Voorheen moesten leerlingen na hun BPC diploma, na vier jaar voortgezet onderwijs, naar Kombissiri, een plaats op 20 kilometer afstand van Gaongho. Dit was voor veel leerlingen een obstakel aangezien men dan niet door de week thuis kon wonen. Veel leerlingen stopten dan ook voordat ze hun BAC hadden. Het BAC geeft toegang tot de universiteit en andere (technische) hogescholen. Het project heeft als effect dat het onderwijsniveau van de bevolking in Gaongho zal stijgen.

In Gaongho zijn er de laatste jaren veel basisscholen bijgebouwd. Hierdoor is de toestroom van basisschool leerlingen naar het voortgezet onderwijs sterk toegenomen. Dankzij de bouw van de extra klaslokalen is er nu wel plaats voor de leerlingen. Deze toegenomen toestroom is creëert wel weer opnieuw volle klassen in met name de brugklas. Leerlingen aantallen komen toch weer boven de 60 leerlingen uit. Het lyceum kiest er voor om toch zoveel mogelijk leerlingen toe te laten. Het lyceum kent nu 518 leerlingen met een gemiddeld leerlingen aantal van 65 per klas. De

laagste klassen hebben de meeste leerlingen en de hoogste klassen hebben de minste leerlingen. Acht klassen zijn nu in gebruik genomen. De doorstroming in de komende jaren zal ervoor zorgen dat ook de overige twee klassen worden bezet.

De leerlingen kunnen 's avonds en in het weekend gebruik maken van de verlichte klaslokalen. Er is nog geen functionerend elektriciteitsnetwerk in Gaongho. Hierdoor missen de leerlingen thuis verlichting om huiswerk te maken. De school biedt die mogelijkheid nu wel. Met name voor de examenklassen is dit een uitkomst. Zij kunnen nu met hulp van de leerkrachten hun examens goed voorbereiden.

Het administratiegebouw is een belangrijke voorziening waar vanuit de leerlingen ook worden ondersteund. Er is een onderwijspedagoge aangesteld die ook administratief wordt ingezet. Als leerlingen problemen hebben worden zij door haar geholpen en gecoacht. Een voorbeeld hiervan is dat meisjes die zwanger worden door deze begeleiding toch kunnen doorgaan met hun opleiding. Het leerlingvolg systeem wordt ingezet om de resultaten van de leerlingen te kunnen volgen.

Onderhoud

Het onderhoud van het gebouw en de zonne-energieinstallaties zal worden betaald uit de gebruikelijke bijdrage van de ouders van de leerlingen. De ouderraad heeft samen met de directeur van het lyceum de taak om deze middelen te innen. Jaarlijks zal een bedrag worden gestort aan ADDG voor het onderhoud van de zonne-energiesystemen omdat deze in eigendom blijven van ADDG. ADDG heeft een bruikleencontract met de ouderraad afgesloten voor het gebruik van de zonne-energieinstallaties, waarin ook de onderhoudsverplichting is vastgelegd. Hierin staat ook dat halfjaarlijks onderhoud zal worden gepleegd op de installaties. Door de reservingen zullen reparaties kunnen worden uitgevoerd.

Evaluatie van de uitvoering van het project

1. Het bouwproces heeft helaas veel te lang geduurd. Hierdoor heeft Zeewolde Werelddorp een aantal keer uitstel moeten vragen voordat deze eindverantwoordingsrapportage kon worden ingeleverd. ADDG heeft helaas moeten constateren dat het bouwbedrijf La Routière Internationale onvoldoende personeel leverde om de bouw volgens planning te laten verlopen. Ook bij de afwikkeling van het project bleek de directeur van het bouwbedrijf niet bereikbaar zodat de laatste afwikkelingen moeilijk te realiseren waren. De communicatie tussen het bouwbedrijf en ADDG liet te wensen over.
2. Het bestuur van ADDG heeft te veel tijd genomen in de voorbereiding van het project. Ondanks de reeds aanwezige offertes bij de projectaanvraag is men opnieuw een uitgebreide offerte ronde met maar liefst 8 bedrijven gaan organiseren. De uiteindelijke keuze voor het bedrijf La Routière Internationale bleek een verkeerde keuze. Men heeft zich laten leiden door de grote bouwprojecten die het bedrijf had uitgevoerd, ook in het buitenland. De referenties zijn onvoldoende nagetrokken. ADDG had reeds goede ervaringen met één van de andere aanbieders die in 2009 zes lerarenwoningen had gebouwd. Dit bedrijf heeft ditmaal de opdracht niet gekregen omdat er kleinere zaken niet naar wens waren bij het vorige traject. ADDG heeft met het kiezen voor een te groot en onbekend bedrijf een groot risico genomen. Uiteindelijk heeft men de laatste werkzaamheden en verbeteringen buiten het bouwbedrijf om moeten laten uitvoeren omdat het bedrijf niet meer bereikbaar was. ADDG heeft een boeteclausule toegepast vanwege het te laat opleveren van het project. Met dit geld dat is ingehouden op de factuur van het bouwbedrijf zijn de laatste bouwactiviteiten nog uitgevoerd.
3. Het bestuur van ADDG heeft niet pro-actief gehandeld. Het vertraagde bouwproces trachtte men vlot te trekken door een uitgebreide briefwisseling op te starten. De juridische weg werd niet gekozen omdat de ervaring leert dat procedures eindeloos kunnen voortslepen. De briefwisseling leidde echter niet tot een verbeterde samenwerking. Pas vlak tegen de deadline werd het bestuur van Zeewolde Werelddorp geïnformeerd over het feit dat de deadline niet kon worden gehaald. De deadlines waren vastgesteld op 1 juli 2013 en vervolgens 1 september 2013.
4. Zeewolde Werelddorp heeft na de tweede keer dat de deadline niet werd gehaald ingezien dat de manier van samenwerken van ADDG met het bouwbedrijf geen enkel perspectief bood op een oplossing om tot een afgerond project te komen. Het bestuur heeft vervolgens besloten om in te grijpen door een lokale externe adviseur te vragen om het

projectmanagement op zich te nemen en mee te helpen om het project tot een goed einde te brengen. Er is eind augustus een tussentijdse rapportage verstuurd naar Zeewolde Werelddorp met foto's waaruit bleek dat het project wel ver gevorderd was. De adviseur heeft geholpen als mediator tussen het bestuur van ADDG en de directie van het bouwbedrijf. Daarnaast heeft de adviseur ervoor gezorgd dat de laatste werkzaamheden door een ander bedrijf werden uitgevoerd omdat het bouwbedrijf niet reageerde.

5. Zeewolde Werelddorp heeft in oktober 2013 een afgevaardigde gestuurd naar Burkina Faso om de urgentie van het afronden van het project te benadrukken. De samenwerking tussen ADDG verliep hierbij wisselend. Het bestuur van ADDG heeft de neiging om te veel projecteigenaar te willen zijn. Door steeds een eigen koers te willen varen, hield ADDG te weinig rekening met het feit dat ook door Zeewolde Werelddorp de middelen verantwoord moeten worden. Hierdoor stagneerde de afwikkeling van het project. De adviseur heeft het proces weer vlot kunnen trekken geholpen door de afgevaardigde van Zeewolde Werelddorp. Gelukkig heeft de opening van het nieuwe schooljaar 2013/2014 niet onder de situatie te leiden gehad. Alle leerlingen konden op tijd starten met hun schooljaar.
6. De uitkomst van de evaluatie die het bestuur van Zeewolde Werelddorp heeft gemaakt naar aanleiding van de problemen die tot op het laatste moment aanhielden met het bestuur met betrekking tot de afwikkeling van het project hebben het bestuur doen besluiten in de toekomst bij nieuwe projecten de extern adviseur in te huren bij alle projectfasen. Om niet weer dezelfde problemen tegen te komen zullen er vooraf duidelijke kaders moeten liggen waarbinnen het projectmanagement moet plaats vinden. Deze kaders zullen in goed onderling overleg tussen de beide besturen met inbreng van de extern adviseur worden uitgewerkt.



B. Financieel verslag

Inkomsten

Financierende organisatie	Verwachte Dekking	gerealiseerde Dekking
Turing Foundation	29.052	30.000
Benefietconcerten	2.500	1.164
Grote scholenactie maart 2012	23.000	27.000
Donateurs, particuliere, giften en kerkcollectes	7.500	7.186
Wilde Ganzen	18.150	18.500
Rotary		3.000
Totaal		87.350

Overboekingen

Eerste deel Wilde Ganzen	08/05/2012	53.646,59
Tweede deel ZWD	02/07/2012	23.510,00
Derde deel ZWD voorschot op nabetaling Turing	16/04/2013	10.000,00
Bankkosten		193,21
Totaal		87.156,80

Uitgaven

Projectbegroting	Begroot in fcfa	Werkelijk in fcfa
a) Omschrijving		
Bouwkosten voor een gebouw van 4 klassen en een magazijn en een administratiegebouw.		35 061 260
Onderzoek, supervisie en technische controle		2 600 000
Inrichtingskosten, meubilering (schoolbanken, kasten, schoolborden, kantoormeubilair)		8 397 000
Installatie zonne-energiesystemen (360 Watt voor het schoolgebouw / 180 Watt voor het administratiegebouw)		8 926 500
Kosten projectgroep, onvoorziene kosten		3 572 185
Totale projectkosten	59 243 449 (90.317,65 euro)	58 556 945 (89.269,49 euro)
Lokale bijdrage ADDG (3,5%)		2 073 521 (3161,06 euro)
Saldo	687 551 FCFA	1048,16 EURO
Terugstorting naar Zeewolde Wereldorp (96,5% van het positieve saldo)		1011,47 EURO
Associations zijn in Burkina Faso vrijgesteld van BTW betaling.		

Wisselkoers : 655.957CFA = 1 EURO

Extra kosten die Zeewolde Werelddorp heeft gemaakt voor de afwikkeling van het project:

Reis /verblijfkosten afgevaardigde bestuur ZWD 1048,00 EURO

Kosten extern adviseur 518,33 EURO

Dit rapport is opgesteld door Dianne Nicolai.

4 Bezoek aan Gaongho.

Er waren een tweetal redenen om een bezoek aan Gaongho te rechtvaardigen.

De eerste aanleiding van dit bezoek hebt u in het 3^e hoofdstuk kunnen lezen, Een aantal verkeerde beslissingen in het bouwproject maakten het noodzakelijk om één van onze bestuursleden, Dianne Nicolai naar Gaongho te sturen.

Het doet ons genoegen u te kunnen zeggen dat de problemen zijn opgelost en tevens duidelijke afspraken hebben gemaakt met het ADDG bestuur en met George Nounkoundi, die bij volgende projecten als adviseur zal optreden.

We hebben met George al jaren ervaring als projectleider in andere projecten,

Op aangeven van Arend Koekoek heeft het bestuur van ZWD heeft eerder in 2013 de wens geuit om een waterproject op te starten, ten behoeve van de landbouw in Gaongho.

Een gedegen vooronderzoek was echter wenselijk. We vonden de organisatie PUM (Project Uitzending Managers) bereid om dit voor ons te doen.

Arend, zelf lid van PUM, heeft dit onderzoek gedaan.

De conclusie van zijn onderzoek heeft de haalbaarheid van druppelirrigatie aangetoond. In 2014 zullen we een honderd gezinnen een systeem aanbieden voor een tuintje van 10 x 20 meter. De verwachting is dat dit voldoende is om betreffende gezinnen voldoende eten te geven gedurende het hele jaar.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de toepassing van "Touwpompen".

5 financieel overzicht 2013.

	Begin balans		Kosten Opbrengsten		Eind balans	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Activa						
Bank betaalrek.	92,40		15.919,27	14.883,82	1.127,85	
Banksparen	10.794,48	0,00	2.850,00	10.050,00	3.594,48	
Nog te ontvangen			11.000,00		11.000,00	
Totaal	10.886,88	0,00	18.769,27	24.933,82	15.722,33	0,00
Passiva						
Reserve 2012	0,00	10.886,88	0,00	0,00		10.886,88
Reserve 2013			0,00	4.835,45		4.835,45
Totaal	0,00	10.886,88	0,00	4.835,45	0,00	15.722,33
Totaal balans	10.886,88	10.886,88	18.769,27	29.769,27	15.722,33	15.722,33
Inkomsten						
Donaties	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	
Giften	0,00	0,00	0,00	11.302,74	11.302,74	
Concert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Statiegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Loten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zeewolde	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Verkoop nestkast	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	
Overige	0,00	0,00	0,00	55,53	55,53	
Totaal	0,00	0,00	0,00	16.869,27	16.869,27	0,00
Kosten						
Bank	0,00	0,00	190,89			190,89
Website	0,00	0,00	95,59			95,59
Kantoor	0,00	0,00	0,00			0,00
Drukwerk	0,00	0,00	0,00			0,00
Wilde Ganzen	0,00	0,00	0,00			0,00
Projecten	0,00	0,00	0,00			0,00
Overige	0,00	0,00	11.747,34			11.747,34
Totaal	0,00	0,00	12.033,82	0,00	0,00	12.033,82
Resultaat						4.835,45

6 Plannen voor 2014.

Gaongho.


Begin 2014 zullen we het bestuur van de ADDG vragen om voor ca 100 gezinnen een plan op te stellen voor de installatie van druppelirrigatiesystemen.

In dit plan moet worden vastgelegd welke gezinnen daarvoor in aanmerking komen.

Hoe in het onderhoud van deze systemen wordt voorzien.

Tevens een begroting van de kosten voor de aanleg van 100 systemen.

Voor de ontwikkeling van de touwpompen moet onderzocht worden wie de productie op zich kan nemen en op welke plaatsen een pomp geïnstalleerd kan worden.

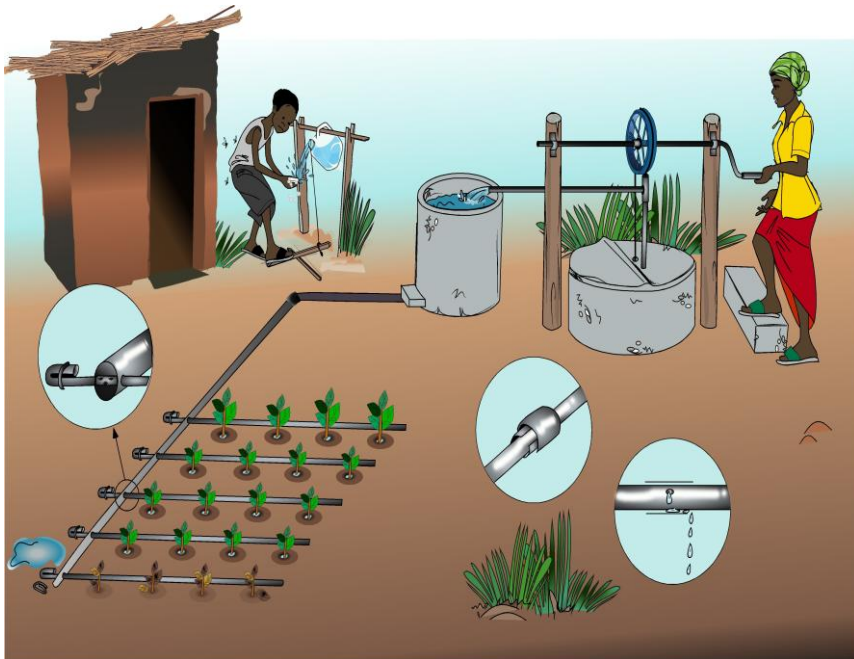

Eenvoudige weergave van onze plannen

Zeewolde.

Het plan voor fondsenwerving om onze projecten te financieren is nog niet helemaal uitgewerkt. Benefietconcerten en het winnen van donateurs staan zeker op ons lijstje.

7 Caritas binnen de parochie “Sterre Der Zee”

De P.C.I. “Parochiële Charitatieve Instelling” van de Rooms Katholieke kerk in Zeewolde heeft haar medewerking aan ons toegezegd voor de komende tijd. Het bestuur van ZWD is bijzonder blij met dit besluit en hopen op een goede samenwerking.

De P.C.I. heeft ter gelegenheid van dit besluit onderstaande brief verspreidt.

Caritas binnen onze parochie.

In de kern staat Caritas voor het doen van naastenliefde aan hulpbehoeftenden. Dat kan zijn binnen je eigen kenniskring, parochiegemeenschap, maar ook elders en zelfs in het buitenland. Dat kan klein zijn als het vervoeren van iemand, maar ook het participeren in grote projecten. Steeds meer mensen worden direct en indirect op een pijnlijke manier geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis, ook binnen onze parochiegemeenschap. En niet overal kunnen deze mensen op een reguliere wijze worden opgevangen, de Caritas probeert hier enige verlichting in te geven.

De PCI, de parochiële caritas instelling van onze parochie, geeft hulp door financiële ondersteuning te geven aan o.a. de Arme Kant van Zeewolde, de Ziekendag, de Kostmand en de Stichting WOU (werkgroep opvang uitgeprocedeerden). Naast deze bijdragen wordt ook materiële en financiële hulp verleend op individuele basis. Op basis van signalen uit ons netwerk wordt ondersteuning gegeven met inachtneming van regels omtrent integriteit, vertrouwen en zorgvuldigheid. Het opsporen van deze “armoede achter de voordeur” is niet altijd makkelijk, men loopt hier niet mee te koop. Wij willen u vragen contact met ons op te nemen, wanneer u vermoedt dat hulp geboden is.

De Caritas gaat ook een nieuwe impuls geven aan liefdadigheid over de grenzen. Onlangs heeft het parochiebestuur besloten actief te participeren in het bij iedereen bekende Zeewolde Werelddorp. Door hiervoor te kiezen verwachten we invulling te kunnen geven aan de verbondenheid met andere kerken en organisaties in de Zeewolder gemeenschap. Binnenkort zult u meer informatie ontvangen over de wijze waarop we deze samenwerking gaan vorm geven.

Momenteel groeit de vraag naar ondersteuning, de uitgaven nemen toe, terwijl de reguliere inkomsten hierbij achter blijven. Wij vragen u dan ook het Caritaswerk te ondersteunen met een eenmalige gift of een periodieke overmaking op rek.nr.430701926 t.n.v. de Parochiële Caritas Instelling Zeewolde.

Wij zijn blij met iedere bijdrage en mocht u op een andere manier willen meedenken/werken aan de Caritasdoelstellingen of meer informatie willen, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Kampen,

Paul Leferink,

Jan Seesing, pci.sterrederzee@hotmail.nl

8 Het bestuur

Voorzitter	Ditta Nicolai	v.d. Hamlaan	Dronten
Secretaris	Diana Kraak	Distel	Zeewolde
Penningmeester	Piet Stam	Cirrus	Zeewolde
Afrika zaken	Dianne Nicolai	Graaf Adolfstraat	Leerdam
Afrika zaken	Issouf Compaore	Graaf Adolfstraat	Leerdam
Leden	Arend Koekoek	Nachtegaallaan	Zeewolde
	Anneke Mulder	Muiderweg	Zeewolde
	Paul Bosveld	Egelantier	Zeewolde
	Wouter Hartman	Mistral	Zeewolde

Stichting Zeewolde Werelddorp

Per adres;

**P.Stam
Cirrus 5
3893 DC Zeewolde**

036 5222175

p.stam@concepts.nl

Nummer kamer van koophandel 3271110

Fiscal nummer 8223.18.039

Bank nummer NL 16 INGB 0005479553

Accountant ADW accountants Zeewolde
